


一、开班说明00:00

1. 课程内容的介绍 00:36

计算机软件资格考试 信息系统项目管理师 主讲：石惠珠

-
- **课程重要性：**模块二（项目十大管理）是考试分值最高、学习深度要求最大的核心内容，建议优先学习
- **教材特点：**第四版教材共24章734页，文字量大且抽象，建议以网校讲义为主教材为辅
- **教材购买建议：**
 - 类型一：考试必备教材才有安全感的学员
 - 类型二：讲义内容掌握后需要补充学习的学员
 - 初期学习可暂不购买，后续根据需要购置

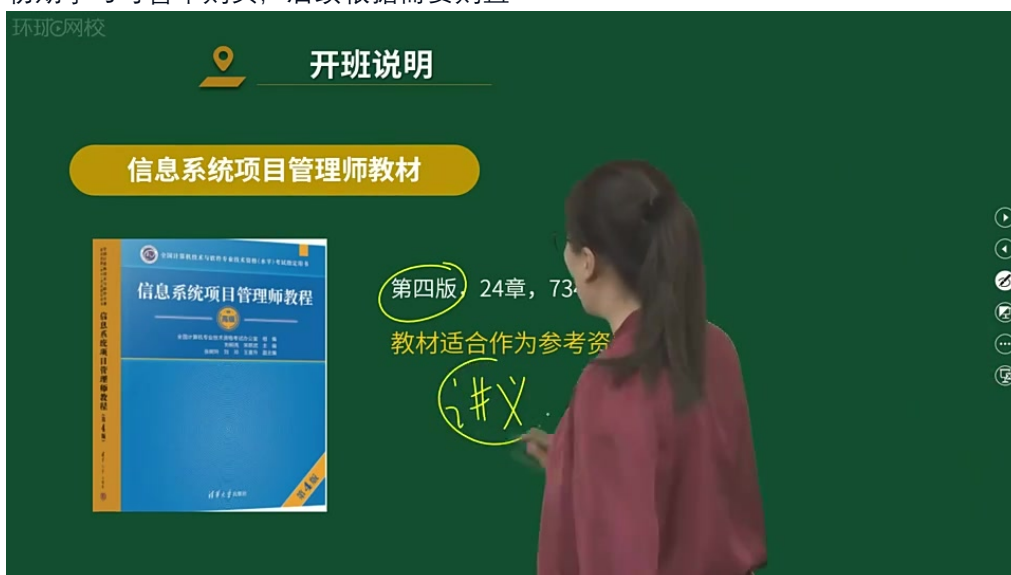

-
- **教材定位：**全国计算机专业技术资格考试指定用书，但更适合作为参考资料使用
- **学习策略：**环球网校讲义内容已足够通过考试，重点在于消化讲义知识

2. 教材章节分析 02:38

开班说明

教材章节	第1章 信息化发展 第2章 信息技术发展 第3章 信息系统治理 第4章 信息系统管理 第5章 信息系统工程	第8章 项目整合管理 第9章 项目范围管理 第10章 项目进度管理 第11章 项目成本管理 第12章 项目质量管理 第13章 项目资源管理 第14章 项目沟通管理 第15章 项目风险管理 第16章 项目采购管理 第17章 项目干系人管理
	第6章 项目管理概论 第7章 项目立项管理	第18章 项目绩效域 第19章 配置与变更管理
	共24章	第20章 高级项目管理 第22章 组织通用治理 第23章 组织通用管理
		第21章 项目管理科学基础 第24章 法律法规与标准规范

- 模块划分标准：根据考核重要性、学习方法和考试频率划分
- 核心模块：
 - 模块二（8-17章）：十大管理，考核单选+案例+论文
 - 模块三（6/7/18/19章）：管理基础，偶考论文
- 次要模块：
 - 模块四（20/22/23章）：高级管理，主考单选题
 - 模块五（21/24章）：科学管理与法规标准
 - 模块一（1-5章）：技术部分，纯文字记忆

3. 模块化教学 04:43


开班说明

模块化教学

模块	内容	章节	学习顺序
模块一	技术部分	第1-5章	共5章
模块二	十大管理	第8-17章	共10章
模块三	管理基础	第6、7、18、19章	共4章
模块四	高级管理	第20、22、23章	共3章
模块五	科学管理	第21、24章	共2章


- 学习顺序：建议按模块二→三→四→五→一的顺序学习
- 学习方法：
 - 模块二：以理解为主（考核三种题型）
 - 其他模块：以记忆为主（主考单选题）
- 特殊说明：25年上半年曾考核模块三的绩效率论文题

4. 课程学习建议 05:43

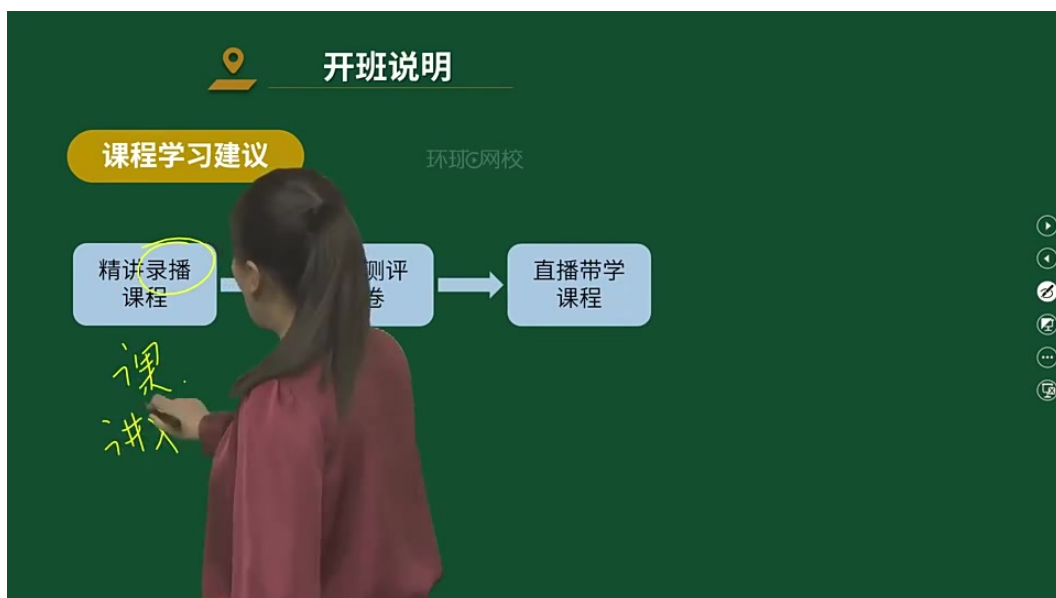


-
- **三阶段学习法：**
 - 精讲录播：基础学习，可随时暂停复习
 - 测评试卷：通过题目巩固知识点
 - 直播带学：按计划强化重难点
- **计划执行：**需配合网校制定的周学习计划完成对应模块

5. 学习注意事项 07:56

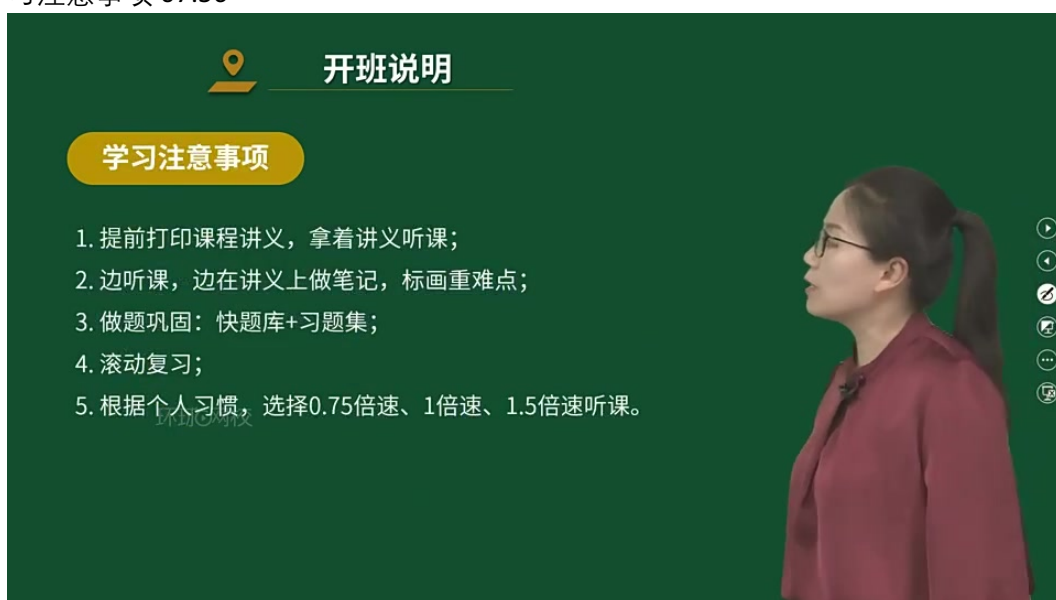

-
- **讲义使用：**
 - 必须提前打印讲义听课
 - 边听边做笔记标注重难点
- **复习方法：**
 - 配合快题库/习题集做题巩固
 - 采用滚动复习法强化记忆
- **听课技巧：**
 - 推荐1倍速正常听讲
 - 0.75倍速辅助理解
 - 避免1.5倍速影响学习效果

二、十大管理知识体系 09:16

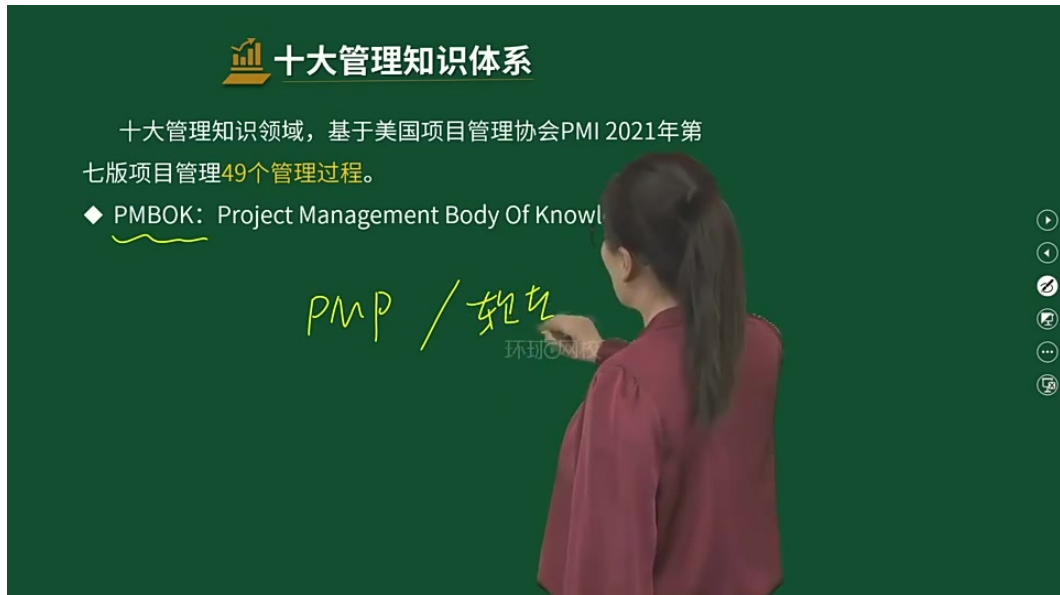

- 体系来源：基于美国项目管理协会(PMI)2021年第七版《项目管理知识体系指南》(PMBOK)的49个管理过程
- 国际认证：PMP(项目管理专业人士)认证
- 国内应用：中国软考的核心内容，是国内大多数管理类考试的基础体系

1. 十大管理知识领域 15:56



- 两大分类维度：
 - 时间维度：五大过程组(启动、规划、执行、监控、收尾)
 - 知识领域：十大管理领域(整合、范围、进度、成本等)
- 学习特点：
 - 滚雪球式学习：49个过程相互关联形成完整体系
 - 初期难度：需要适应大量专业术语
 - 后期简化：术语重复使用，理解逐渐深入

2. 以人为本 16:11

- 核心理念：项目管理应以人的健康和权益为优先
- 具体表现：
 - 人员生病时应优先休息，而非强行交接工作

- 原则上避免加班，必须加班时需支付加班费
- 团队成员的福祉高于项目进度要求

3. 根据环境剪裁 17:07

- **应用原则：**49个过程应根据实际项目情况灵活选用
- **具体表现：**
 - 小型项目可简化或跳过某些过程(如两人项目可不制定正式章程)
 - 管理文件可灵活处理(可概括/详细，正式/非正式)
 - 风险登记册等文档甚至可以不创建

4. 滚动式规划 18:16

- **规划方法：**分阶段逐步完善项目计划
- **实施要点：**
 - 近期计划详细制定
 - 远期计划保持框架性
 - 随项目推进不断细化远期计划
- **相关概念：**渐进明细(可交付成果由粗到细逐步完善)

5. 总结 19:30



- **过程学习三要素：**
 - 输入：参考的文档和依据(如合同、组织资产)
 - 输出：产生的成果(如项目章程)
 - 工具与技术：使用的方法(如专家判断、会议)
- **学习重点：**
 - 理解过程含义比死记输入输出更重要
 - 关注关键输入输出而非全部内容
 - 工具技术在不同过程中含义一致

6. 贯穿于全程的过程 19:45

十大管理知识体系

本过程仅开展一次或仅在项目的预定义时开展：

- ◆ 制定项目章程
- ◆ 规划范围管理
- ◆ 规划进度管理
- ◆ 规划资源管理
- ◆ 规划采购管理
- ◆ 收集需求
- ◆ 创建WBS
- ◆ 结束项目或阶段

环班网校

- 非全过程：
 - 制定项目章程(项目启动时)
 - 各规划过程(范围/进度/资源/采购管理)
 - 收集需求和创建WBS(确定范围基准)
 - 结束项目或阶段(项目收尾时)
- 特点：这些过程通常在项目特定时点一次性完成，不随项目进展反复进行

三、项目整合管理21:16

1. 项目整合管理概念 21:19

知识点 项目整合管理

项目整合管理包括识别、定义、组合、统一和协调项目管理过程组的各个过程和项目管理活动。在项目管理中，整合管理兼具统一、合并、沟通和建立联系的性质，项目整合管理贯穿项目始终。

环班网校

- 定义：项目整合管理包括识别、定义、组合、统一和协调项目管理过程组的各个过程和项目管理活动。在项目管理中，整合管理兼具统一、合并、沟通和建立联系的性质，贯穿项目始终。
- 核心特征：
 - 整合对象：将项目各个方面（进度、成本、质量等）统一管理
 - 责任归属：项目经理是项目整合管理的唯一负责人，被称为"项目整合者"
 - 持续性：贯穿项目全生命周期

知识点 项目整合管理

环球网校

项目整合管理目标：

1. 资源分配；
2. 平衡竞争性需求；
3. 研究各种备选方法；
4. 裁剪过程以实现项目目标；
5. 管理各个项目管理知识领域之间的依赖关系。

- 五大目标：
 - 资源分配：将关键资源（如高级开发工程师）用于最关键需求
 - 平衡竞争性需求：协调相互矛盾的目标（如进度压缩会导致成本增加）
 - 研究备选方法：为问题选择最适合的解决方案
 - 裁剪过程：根据项目特点调整管理过程
 - 管理依赖关系：协调各知识领域（如进度、成本、质量管理）的相互关系
2. 管理基础 24:08

知识点 管理基础

一、执行整合

项目整合管理由项目经理负责，项目整合管理的责任不能被授权或转移，项目经理必须对整个项目承担最终责任。

◆ 组织层面：项目经理与项目发起人携手合作，了解战略目标并确保项目目标和成果与项目组合、项目集以及业务领域保持一致。

◆ 项目层面：项目经理负责指导团队关注真正重要的事务并协同工作。为此，项目经理需要整合过程、知识和人员。

- 责任特性：
 - 不可转移性：整合管理责任不能授权或转移
 - 最终责任：项目经理必须对整个项目承担最终责任
- 组织层面整合：
 - 与项目发起人合作确保项目目标与战略目标一致
 - 协调项目与项目集、项目组合的关系
- 项目层面整合：
 - 指导团队关注核心事务
 - 整合过程、知识和人员

知识点 管理基础

1. 过程层面执行整合

项目管理过程中有些过程可能只发生一次（例如项目章程的初始创建），但很多过程在整个项目期间会相互重叠并重复发生多次，比如需求变更。在整个项目期间实施整体变更控制过程是为了整合变更请求。

环球网校

2. 认知层面执行整合

管理项目有多种方法，方法的选择通常取决于项目的具体特点，包括规模、项目或组织的复杂性，以及组织文化。项目经理应尽量熟练掌握所有项目管理知识领域。

-
- 过程层面：
 - 项目管理过程可能重叠和重复发生（如需求变更）
 - 通过整体变更控制整合变更请求
- 认知层面：
 - 根据项目特点（规模、复杂性、组织文化）选择管理方法
 - 需要掌握所有项目管理知识领域
- 背景层面：
 - 关注新技术和环境变化
 - 利用有利环境因素，规避不利因素

知识点 管理基础


二、整合的复杂性

项目的复杂性来源于组织的系统行为、人类行为以及组织或环境中的不确定性。

复杂性含义：

- (1) 包含多个部分；
- (2) 不同部分之间存在一系列关联；
- (3) 不同部分之间的动态交互作用；
- (4) 这些交互作用所产生的行为远远大于各部分简单的相加。

-
- 复杂性来源：
 - 组织系统行为
 - 人类行为
 - 组织或环境的不确定性
- 复杂性表现：
 - 包含多个部分
 - 部分之间存在关联
 - 部分间有动态交互
 - 交互效果远大于简单相加

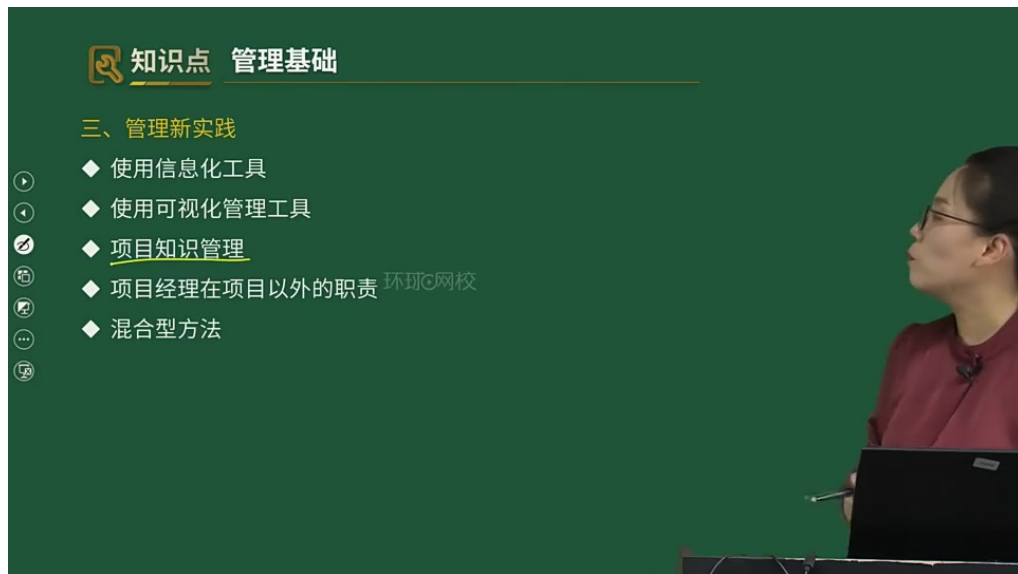

-
- **现代方法：**
 - 使用信息化工具
 - 可视化工具（燃尽图等）
 - 项目知识管理
 - 关注项目外部职责
 - 混合型方法（多种方法结合使用）
- **项目管理计划：**
 - **十个管理计划：** 范围、需求、进度、成本、质量、资源、沟通、风险、采购、干系人参与
 - **其他内容：** 变更管理计划、配置管理计划、绩效测量基准、项目生命周期描述、开发方法
 - **三个基准：** 范围基准、进度基准、成本基准
- **项目文件：**
 - 过程性文件（如干系人登记册、风险登记册、经验教训登记册）
 - 各类清单（活动清单、里程碑清单）
 - 日志（假设日志、变更日志、问题日志）
- 1) 项目整合管理过程 32:34
- **七个核心过程：**
 - 制定项目章程（启动）
 - 制订项目管理计划（规划）
 - 指导与管理项目工作（执行）
 - 管理项目知识（执行）
 - 监控项目工作（监控）
 - 实施整体变更控制（监控）
 - 结束项目或阶段（收尾）
- **整合本质：** 整合各过程组的输出
 - 项目章程整合启动过程组
 - 项目管理计划整合规划过程组
 - 指导工作整合执行过程组
 - 监控工作整合监控过程组

四、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
-----	------	-----------	------

十大管理模块	项目的核心领域（整合/范围/进度/成本/质量/资源/沟通/风险/采购/干系人管理）	分值最高，需理解性学习	★★★★
教材使用建议	以环球网校讲义为主，教材（第四版734页）作参考	教材文字抽象，仅适合查阅；两类需购教材人群：心理依赖者/讲义掌握后的补充学习者	★★
五大模块学习顺序	模块二（十大管理）→模块三（辅助扩展）→模块四（高级管理）→模块五（科学基础）→模块一（技术部分）	模块二需理解，其他模块可记忆；模块三可能考论文（如绩效率）	★★★
49个过程体系	源自PMBOK第七版，分五大过程组（启动/规划/执行/监控/收尾）和十大管理领域	输入输出工具与技术是学习框架，但避免死记硬背，需理解过程含义	★★★★
整合管理目标	资源分配、平衡竞争需求、研究备选方法、裁剪过程、管理依赖关系	案例分析高频考点（如“用奥拓预算造奥迪”矛盾示例）	★★★
项目管理计划vs项目文件	计划：如何管理项目（含10+子计划/基准）；文件：过程产物（如风险登记册）	关键区分：章程不属于两者，文件≠计划	★★★
整合管理七大过程	制定章程→制定计划→指导工作→管理知识→监控工作→实施变更→结束项目	贯穿五大过程组，如制定章程仅启动阶段一次，监控工作全程持续	★★★★
学习工具与方法	录播课+直播带学+测评试卷三轮巩固；建议1倍速听课，讲义标注重难点	易忽略点：滚动复习与做题巩固的必要性	★★
PMP与软考体系关联	中国软考以PMBOK体系为主体，认证内容与美国PMP同源	术语混淆点：PMBOK（非PM Book）	★★
项目管理基本原则	以人为本、环境裁剪、文件灵活性、滚动规划、渐进明细、全员参与、过程持续性	选项高频正确表述（如“非正式文件可接受”）	★★★
