

一、制定项目章程 00:08

1. 制定项目章程过程 01:42

1) 项目章程的主要作用 02:25

环班网校

知识点 制定项目章程

制定项目章程是编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程。

- ✓ 批准项目的合法地位
- ✓ 授权项目经理在项目活动中使用组织资源

本过程的主要作用：

- (1) 明确项目与组织战略目标之间的直接联系；
- (2) 确立项目的正式地位；
- (3) 展示组织对项目的承诺。

- 核心功能：编写正式文件批准项目并授权项目经理使用组织资源
- 双重作用：
 - 批准项目的合法地位（相当于项目"结婚证"）
 - 授权资源使用（如200万项目预算的财务支配权）
- 战略价值：
 - 明确项目与组织战略目标的直接联系
 - 确立项目正式地位（相当于公司"立项"证明）
 - 展示组织承诺（类似结婚证体现双方承诺）

2) 项目章程的细节 03:11

- 与合同的区别

环班网校

知识点 制定项目章程

项目章程细节：

- (1) 项目章程不能当作合同，合同用来达成外部合作协议。项目章程用于建立组织内部的合作关系；
- (2) 项目章程在项目执行和项目需求之间建立了联系；
- (3) 项目章程可以由发起人编制，也可由项目经理与发起机构合作编制；
- (4) 项目由项目以外的机构来启动，例如发起人、项目集或项目管理办公室（PMO）、项目组合治理委员会主席或其授权代表；
- (5) 项目经理应在规划开始之前任命项目经理，最好在制定项目章程时就任命。

- 法律属性：
 - 合同：规范外部合作（如甲乙双方协议）

- 章程：建立内部合作关系（如公司内部资源授权）
 - 编制流程：
 - 项目经理可参与编制（类似准备结婚证材料）
 - 必须由外部机构批准（如民政局发证，类比发起人/PMO审批）
 - 关键特征：
 - 连接项目执行与需求的桥梁
 - 发起人必须掌握资源审批权（如甲方或公司领导）
 - 制定项目章程的输入
 - 立项管理文件 06:41
 - 基础材料：项目建议书、可行性研究报告等立项文档
 - 作用：提供项目合法性的前期论证依据
 - 其他输入要素 06:53
 - 协议：外部合同的具体条款要求
 - 环境因素：组织文化、基础设施等客观条件
 - 过程资产：历史项目经验、模板等组织知识
- 3) 制定项目章程的输出 07:07
- 项目章程内容

知识点 制定项目章程

输出-1：项目章程

▶

◀

🔍

📌

⋮

🔄

目录	
实施项目项目章程	1
文档目的	4
关键联系信息	4
1. 项目章程介绍	5
1.1 总览	5
1.2 实施服务合同	5
1.3 项目目标	5
1.4 系统实施后的预期收益	7
2. 实施策略	10
3. 实施范围	11
3.1 功能范围	11
3.2 实体范围	15
3.3 技术范围	15
4. 项目组织结构	15
5. 实施方法	16
5.1 项目准备	16
5.2 业务流程图设计	16

-
- 核心要素：
 - 项目目的（存在价值说明）
 - 可测量目标与成功标准（如交付时限、质量要求）
 - 高层级需求描述（初始阶段概要需求）
- 管理要素：
 - 总体里程碑计划（关键时间节点）
 - 预先批准财务资源（如200万预算授权）
 - 关键干系人清单（利益相关方登记）

知识点 制定项目章程

项目章程内容：

- ◆ 项目目的：可测量的项目目标和相关的成功标准
- ◆ 高层级需求、高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果；整体项目风险；总体里程碑进度计划；预先批准的财务资源；关键干系人名单
- ◆ 项目审批要求、项目退出标准
- ◆ 委派的项目经理及其职责和职权；发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权

-
- 风险管控：
 - 整体项目风险说明
 - 边界定义（范围基准）
- 权责明确：
 - 项目经理任命及职权范围
 - 审批人员信息（发起人姓名及权限）

● 假设日志 09:34

知识点 制定项目章程

输出-2：假设日志

风险

假设日志用于记录整个项目生命周期中的所有假设条件和制约因素。

在项目启动之前进行可行性研究和论证时，即开始识别高层级的战略和运营假设条件与制约因素。这些假设条件与制约因素应纳入项目章程。较低层级的活动和任务假设条件在项目期间随着诸如定义技术规范、估算、进度和风险等项目活动开展而生成。

- - 记录内容：
 - 战略级假设（如“甲方6月1日前提供完整需求”）
 - 运营制约因素（如资源可用性限制）
 - 风险关联：
 - 假设不成立时转化为风险（需后续风险分析）
 - 贯穿项目全生命周期动态更新
 - 输出时机：
 - 可行性研究阶段开始识别
 - 随项目深入补充细节假设
- 4) 制定项目章程的输入 10:15
- 立项管理文件 10:24

知识点 制定项目章程

输入-1: 立项管理文件

立项管理包括商业需求和成本效益分析，论证项目的合理性并确定项目边界。立项管理文件不是项目文件，项目经理不可以对它们进行更新或修改，只可以提出相关建议。虽然立项管理文件是在项目之前制定的，但需要定期审核。

立项管理文件：

◆ 项目建议书、可行性研究报告、项目评估报告

-
- **定义与作用：** 立项管理文件包括商业需求分析和成本效益分析，用于论证项目合理性并确定项目边界。典型文件包括项目建议书、可行性研究报告和项目评估报告。
- **管理权限：** 项目经理无权更新或修改立项管理文件，仅能提出建议。这些文件虽在项目启动前制定，但需要定期审核（如技术革新导致原始需求失效时需重新评估项目价值）。
- **审核主体：** 由项目高层管理者（如公司决策层）负责审核，例如电话亭项目因手机普及而失去存在价值时，需由“大老板”决定是否终止。
- 协议 12:20

知识点 制定项目章程 网校

输入-2: 协议

协议有多种形式，包括合同、谅解备忘录、服务水平协议、协议书、意向书、口头协议或其他书面协议。

◆ 为外部客户做项目时，通常需要签订合同

-
- **形式多样性：** 包括合同、谅解备忘录(MOU)、服务水平协议(SLA)、协议书、意向书、口头协议等法律约束力不同的文件形式。
- **外部项目特点：** 为外部客户实施项目时通常采用合同形式，但考试中无需特别记忆具体合同类型，仅需了解口头协议也属于有效协议类型。
- 事业环境因素 14:47

知识点 制定项目章程

输入-3: 事业环境因素

环球网校

输入-4: 组织过程资产

- ◆ 政府或行业标准（如产品标准、质量标准、安全标准和工艺标准）
- ◆ 法律法规要求和相关制约因素
- ◆ 市场条件
- ◆ 组织文化和氛围
- ◆ 组织治理框架
- ◆ 干系人的期望和风险临界值
- ◆ 组织的标准政策、流程和程序
- ◆ 项目组合、项目集和项目的治理框架
- ◆ 监督和报告的方法
- ◆ 模板
- ◆ 历史信息与经验教训知识库

可增删改. 删

- 核心特征：属于不可控的外部约束条件，组织只能适应无法改变。例如：

- 强制标准：政府/行业的产品标准、质量标准、安全标准
- 法律约束：法律法规及相关制约因素
- 市场环境：当前经济状况、供需关系等市场条件
- 组织文化：虽带"组织"二字但属不可改变的环境因素（如996工作文化）
- 治理框架：组织固有的决策层级结构
- 干系人特质：干系人的风险承受阈值和期望值（如投资者要求保本）

- 组织过程资产 16:44

知识点 制定项目章程

输入-3: 事业环境因素

输入-4: 组织过程资产

- ◆ 政府或行业标准（如产品标准、质量标准、安全标准和工艺标准）
- ◆ 法律法规要求和相关制约因素
- ◆ 市场条件
- ◆ 组织文化和氛围
- ◆ 组织治理框架
- ◆ 干系人的期望和风险临界值
- ◆ 组织的标准政策、流程和程序
- ◆ 项目组合、项目集和项目的治理框架
- ◆ 监督和报告的方法
- ◆ 模板
- ◆ 历史信息与经验教训知识库

不仅

可增删改. 删

- 核心特征：组织内部可自主修改的资产，具有"可增删改"特性，包括：

- 流程文件：标准政策、变更控制程序、监督报告方法
- 知识资产：历史项目进度网络图、经验教训知识库
- 工具模板：各类项目管理模板
- 治理结构：项目组合/项目集的灵活管理框架（区别于固定的组织治理框架）

- 例题:影响制定项目管理计划过程的组织过程资产 19:08

知识点 制定项目章程

【例题】能够影响“制订项目管理计划”过程的组织过程资产包括（ ）。

①组织的标准政策
②变更控制程序
③历史项目进度网络图
④特定行业的项目管理知识体系
⑤法律法规和安全标准
⑥历史信息和经验教训知识库

A. ①②③⑥ B. ①③⑤⑥
C. ①③④⑥ D. ①②④⑤

区分

环球网校

■ 解题关键：

- 排除不可修改项（如行业标准、法律法规）
- 确认可修改项：①组织标准政策（可调整）、②变更控制程序（可自定义步骤）、③历史进度网络图（可借鉴修改）、⑥经验教训库（可新增内容）

- 典型错误：将“特定行业知识体系”误认为可修改项（实际为标准框架不可改）

- 答案：A（①②③⑥）

5) 制定项目章程工具与技术 24:58

知识点 制定项目章程

本教材中，**工具集合**有：数据收集、数据分析、数据表现、人际关系与团队技能、决策。

数据收集	数据分析	数据表现
◆ 头脑风暴	◆ 成本效益分析	◆ 亲和图
◆ 焦点小组	◆ 备选方案分析	◆ 因果图
◆ 核对单	◆ 根本原因分析	◆ 流程图
◆ 访谈	◆ 文件分析	◆ 直方图
◆ 标杆对照	◆ 过程分析	◆ 矩阵图
.....	◆ 挣值分析	◆ 散点图
	◆ 绩效审查	
	◆ 趋势分析	
		

环球网校

- 五大工具集合：数据收集、数据分析、数据表现、人际关系与团队技能、决策
- 学习重点：应关注单个工具技术的特点而非分类归属，考试中区分工具类型的题目出现频率较低（“好几次考试才考一道题”）
- 专家判断 28:27

知识点 制定项目章程

工具-1: 专家判断

制定项目章程过程中，应征求具备如下领域相关专业知识或接受过相关培训的个人或小组的意见，涉及领域包括：

- ◆ 组织战略
- ◆ 效益管理
- ◆ 项目所在的行业以及项目关注的领域的技术知识
- ◆ 持续时间和预算的估算
- ◆ 风险识别等领域

环球网校




-
-
- 定义：征求具备专业知识或接受过相关培训的个人/小组意见
- 专家范围：任何人只要具备某领域专业知识即可成为专家（“不是咱们说的那个专家”）
- 应用场景：
 - 组织战略与效益管理
 - 行业技术知识咨询
 - 持续时间与预算估算
 - 风险识别等领域
- 记忆要点：属于项目管理“三大水工具”之一（与会议、引导技术并列）
- 数据收集 29:31
 - 头脑风暴
 - 起源：医学词汇原意为“胡言乱语”
 - 特点：短时间内激发大量创意（“你一句我一句”）
 - 执行关键：禁止对他人想法提出否定意见
 - 两阶段：创意产生 → 创意分析
 - 焦点小组
 - 核心特征：聚焦特定专题问题（“最重要的就是焦点二字”）
 - 参与者：高级干系人+主题专家
 - 优势：比一对一访谈更具互动性
 - 讨论内容：项目风险、成功标准等议题
 - 访谈
 - 形式：与干系人直接交谈（“哥们儿，来，咱俩聊一聊”）
 - 获取信息：
 - 高层级需求
 - 假设条件与制约因素
 - 审批标准等
- 人际关系与团队技能 30:44
 - 冲突管理
 - 作用：促使干系人就目标、成功标准等达成一致
 - 应用场景：意见分歧时使用（“当大家不一致的时候”）
 - 引导技术
 - 实质：会议主持人的技术手段
 - 目的：帮助团队达成决定或解决方案
 - 会议管理

- **全流程：**
 - 会前：准备议程、通知人员
 - 会中：做好记录
 - 会后：发送纪要及行动计划
- **区分要点：**带"管理"二字属于人际关系技能，区别于独立工具"会议"
- **会议 32:13**
 - **独立工具属性：**区别于"会议管理"，是大多数过程通用的独立工具
 - **主要目的：**
 - 识别项目目标与成功标准
 - 确定主要可交付成果
 - 明确高层级需求
 - 制定总体里程碑
 - **关键参与者：**项目关键干系人

二、制定项目管理计划 32:39

1. 制定项目管理计划定义 32:49

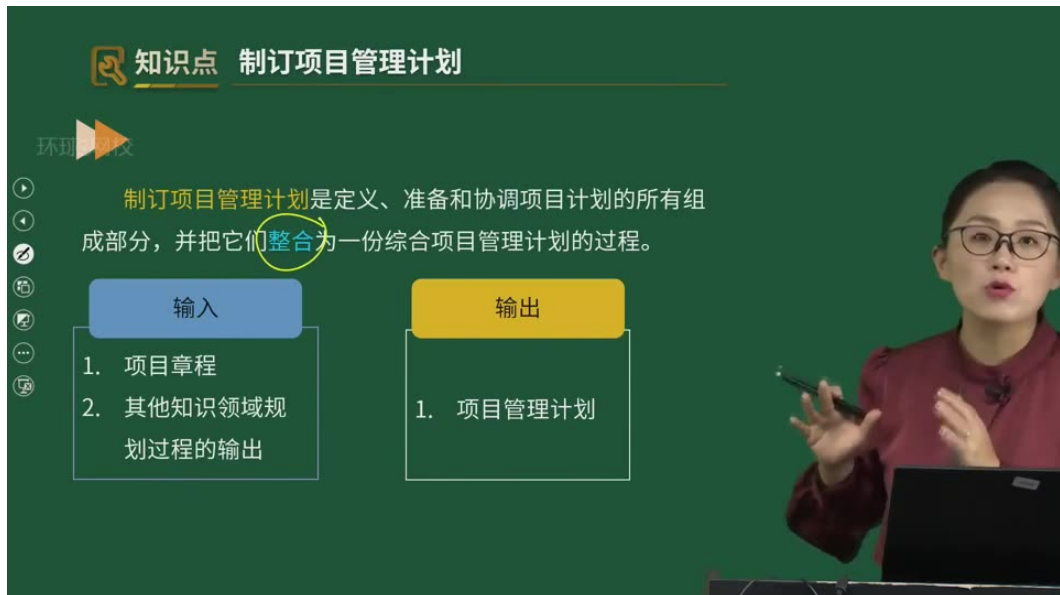

- **过程本质：**定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程
 - **整合特性：**整合了计划过程组的全部输出，输入包括项目章程和其他知识领域规划过程的输出
 - **执行逻辑：**49个过程并非线性执行，而是按管理领域分组学习，实际执行存在交叉和迭代
- ### 2. 为什么要做计划 33:56

知识点 制订项目管理计划

环球网校



1. 为什么要做计划?

- ✓ 为项目绩效考核和控制提供基线

2. 计划赶不上变化怎么办?

- ✓ 变化后要及时更新计划，但更新要走整体变更流程

3. 计划是否做得越细越好?

- 基线作用：为项目绩效考核和控制提供基准参照，如设定1月应完成工作以便进度对比
 - 变更处理：计划赶不上变化时需及时更新，但必须通过整体变更控制流程进行
 - 详细程度：
 - 采用滚动式规划：近期计划详细，远期计划粗略
 - 渐进明细原则：不能期待计划一步到位，需随项目推进逐步细化
3. 制定项目管理计划内容 36:48

知识点 制订项目管理计划

环球网校



正式的子管理计划

项目章程

初步的
项目管理计划

进度管理计划

成本管理计划

质量管理计划

资源管理计划

.....

范围基准

进度基准

成本基准

.....

整合

项目管理计划

项目章程是
初始规划的起点

环球网校

- 形成过程：
 - 起点：项目章程作为初始规划起点
 - 步骤：先制定初步管理计划→正式子管理计划→整合为综合计划
- 核心内容：
 - 十个子管理计划：范围/需求/进度/成本/质量/资源/沟通/风险/采购/干系人参与计划
 - 三个基准：范围基准、进度基准、成本基准
 - 其他组件：变更管理计划、配置管理计划、绩效测量基准、项目生命周期、开发方法、管理审查
- 特殊组件说明：

- 绩效测量基准：如设定月底应完成工作量标准
- 项目生命周期：确定采用预测型或适应型等模式
- 管理审查：规定项目工作的审查方式和流程
- **管理特性：**
 - 基准锁定：确定基准后只能通过变更请求更新
 - 渐进明细：需要通过不断更新来逐步完善细节
 - 灵活裁剪：可根据应用领域和项目复杂度调整详细程度

4. 应用案例 39:55

1) 例题:制定项目管理计划描述

- **题目解析**
 - 选项分析：
 - A错误：项目管理计划不包括管理与控制过程的所有文件（与项目文件区分）
 - B正确：明确规定了执行、监控和结束项目的方式方法
 - C错误：工作绩效信息是监控过程组输出，不属于计划内容
 - D错误：应遵循渐进明细原则，而非基于实施细节制定
 - 答案：B
 - 易错点：容易混淆项目管理计划与项目文件的包含关系

5. 制定项目管理计划工具与技术 43:45

知识点 制订项目管理计划

制订项目管理计划工具与技术

1. 专家判断
2. 数据收集
 - ◆ 头脑风暴、**核对单**、焦点小组、访谈
3. 人际关系与团队技能
 - ◆ 冲突管理、引导、会议管理
4. 会议

环球网校

- **主要工具：**
 - 专家判断：利用专家经验指导计划制定
 - 数据收集：包括头脑风暴、核对单、焦点小组、访谈等方法
 - 人际关系与团队技能：冲突管理、引导、会议管理等
 - 会议：特别是项目开工会议

知识点 制订项目管理计划

工具-1: 核对单

很多组织基于自身经验制定了标准化的核对单，或者采用所在行业的核对单。核对单可以指导项目经理制订计划或帮助检查项目管理计划是否包含所需的全部信息。

工具-2: 焦点小组

召集干系人讨论项目管理方法以及项目管理计划各个组成部分的整合方式。

环球网校



- 核对单：
 - 作用：检查项目管理计划是否包含全部必要信息
 - 来源：组织自建标准化清单或行业通用清单
 - 应用：类似任务清单，逐项核对确保完整性
- 焦点小组：
 - 特点：召集干系人就特定专题（如计划整合方式）进行集中讨论
 - 与访谈区别：是多对多的群体讨论形式

知识点 制订项目管理计划

工具-3: 会议

项目: 启动会——项目章程

利用项目开工会议来明确项目规划阶段工作的完成并宣布开始项目执行阶段，目的是传达项目目标、获得团队对项目的承诺，以及阐明每个干系人的角色和职责。

- ◆ 小型项目：项目在启动之后就会开工
- ◆ 大型项目：开工会议在执行阶段开始时召开
- ◆ 多阶段项目：每个阶段开始时都要召开一次开工会议

环球网校

- 项目开工会议：
 - 作用：正式宣布项目管理计划完成，进入执行阶段
 - 内容：传达目标、获取团队承诺、明确角色职责
 - 召开时机：
 - 小型项目：启动后立即召开
 - 大型项目：执行阶段开始时召开
 - 多阶段项目：每个阶段开始前召开
- 与启动会议区别：
 - 启动会议：发布项目章程，确定项目经理
 - 开工会议：批准项目管理计划，启动项目执行

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
项目章程	定义项目合法地位，授权项目经理使用组织资源	不属于项目管理计划或项目文件，需由发起人或外部机构批准	★★★
项目管理计划	整合所有子管理计划（10个）和基准（范围/进度/成本）	与项目文件的区别，基准变更需走流程	★★★★
事业环境因素 vs 组织过程资产	不可控（如法规/市场）vs 可控（如模板/流程）	区分“组织文化”归属（事业环境因素）	★★★★
专家判断	任何具备专业知识者均可参与	高频工具，三大“水工具”之一（另含会议、引导技术）	★★
焦点小组	针对特定专题的高级干系人讨论	比访谈更具互动性，主题需明确	★★★
核对单	标准化清单用于检查计划完整性	易与“核对表”混淆，实际功能相同	★★
项目开工会议	宣布项目管理计划，进入执行阶段	区别于启动会议（发布章程）	★★★
渐进明细	近细远粗的滚动式规划	非“计划越细越好”，需适应变化	★★★
假设日志	记录假设条件与制约因素	未满足的假设可能转为风险	★★
冲突管理	协调干系人达成目标共识	属于人际关系与团队技能	★★★
